



आ.व. २०७८/२०७९

दोश्रो चौमासिक सम्मको प्रगति

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय, सुर्खेत.

गोपाल शर्मा
सि.डी.ई

कर्णाली प्रदेश परिचय




कर्णाली प्रदेश - नेपाल



नेपाल

स्थानीय तह - कर्णाली प्रदेश				
जिल्ला	नगरपालिका संख्या	गाउँपालिका संख्या	जम्मा वडा	जनसंख्या
सुकुम	३	३	७३	१५५३८३
सल्यान	३	७	८३	२४२४४४
सुर्खेत	५	४	९९	३५०८०४
दैलेख	४	७	९०	२६१७७०
जाजरकोट	३	४	७७	१७१३०४
डोल्पा	२	६	६५	३६७००
जुम्ला	१	७	६०	१०८९२१
कालिकोट	३	६	८२	१३६९४८
मुगु	१	३	४४	५५२८६
हुम्ला	०	७	४४	४०८५८
जम्मा	२५	५४	७१८	१५७०४१८

- संकेत**
- जिल्ला सिमाना
 - गाउँ/नगरपालिका सिमाना
 - ★ जिल्ला सदरमुकाम
 - प्रादेशिक सहयोग इकाई - सुर्खेत
 - xxx नगरपालिका
 - xxx गाउँपालिका

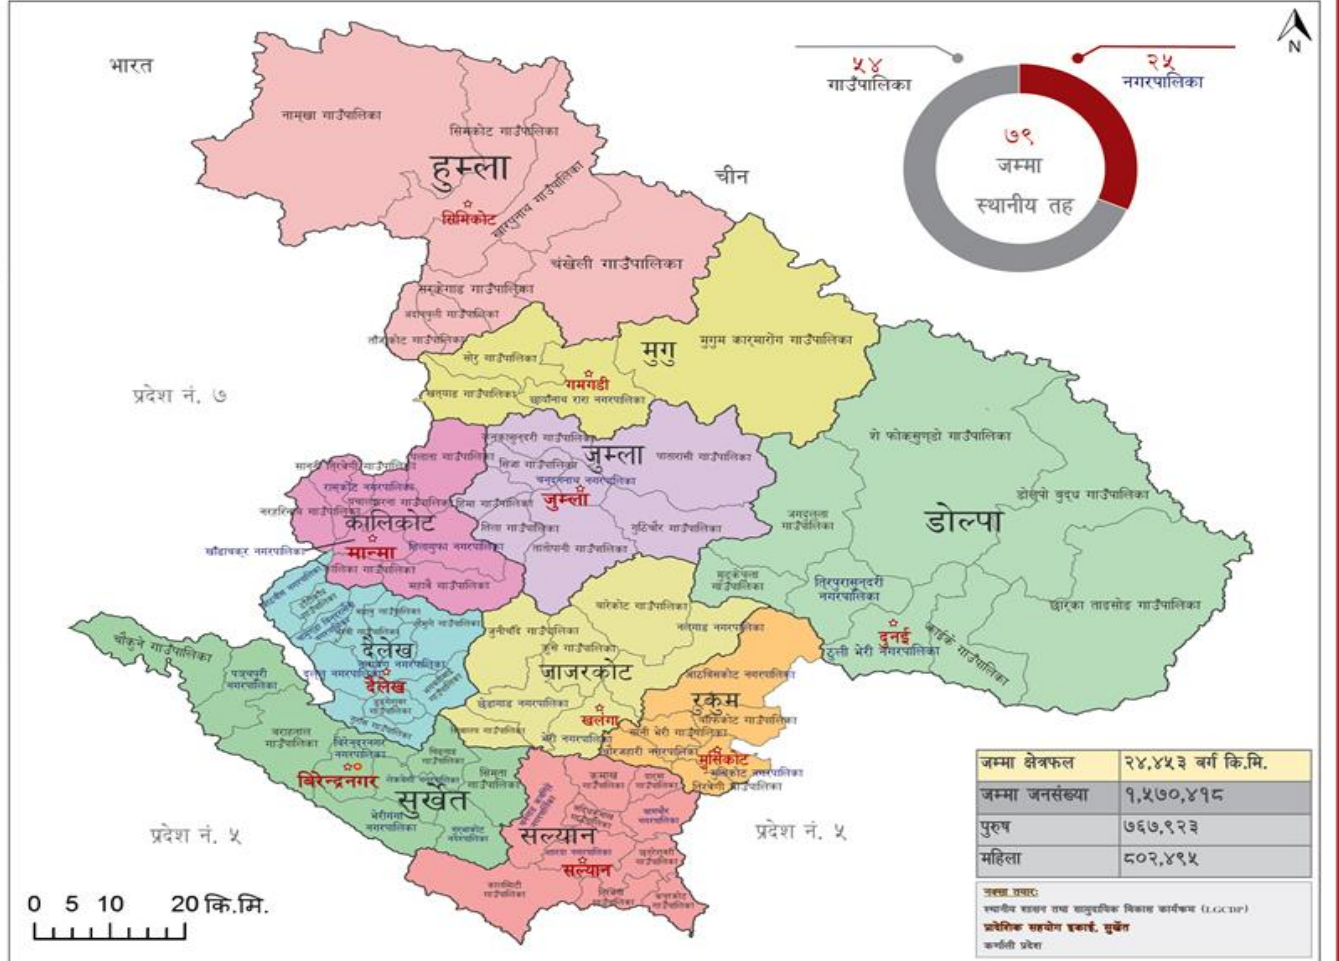

खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा विकाश निर्देशनालय सुर्खेतको दोश्रो चौमासिकसम्मको प्रगति

(रु. हजारमा)

क्र.सं.	खर्च शिर्षक	कार्यक्रम क्रियाकलाप	विनियोजन र लक्ष्य		भौतिक प्रगति		वित्तीय प्रगति	
			भौतिक लक्ष्य (प्रतिशत, वटा)	विनियोजन रकम	परिमाण (प्रतिशत, वटा)	प्रगति प्रतिशत	बजेट (खर्च)	प्रगति प्रतिशत
१	चालु खर्च	चालु खर्च		९७५२			४३७४	४५
२	समानिकरण	सिंचाई	११२	१६०८००	२४	२२	१२७०५	८
		नदि नियन्त्रण	५५	९९१००	३०	३८	१३९७८	१४
		उर्जा	७	४७०००	४	८०	९०९६	१९
		खानेपानी	१४९	२४६७४०	१२	१४	२२३८७	९
		अन्य सार्वजनिक सुधार	१	४०००	३०	१९	०	०
३	सशर्त (संघ)	सिंचाई	१६	५७५००	८	४०	१०३९८	१८
		खानेपानी	५२	३६८००	६	१७	१४९	१
		खानेपानी गुणस्तर	५	३६५००	२	३०	८०५१	२२
कुल जम्मा			३९७	६८८४४०		२६	८११३८	१२

खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा विकाश कार्यालय सल्यानको दोश्रो चौमासिकसम्मको प्रगति

(रु. हजारमा)

क्र. सं.	खर्च शिर्षक	कार्यक्रम क्रियाकलाप	विनियोजन र लक्ष्य		भौतिक प्रगति		वित्तिय प्रगति	
			भौतिक लक्ष्य (प्रतिशत, वटा)	विनियोजन रकम	परिमाण (प्रतिशत, वटा)	प्रगति प्रतिशत	बजेट (खर्च)	प्रगति प्रतिशत
१	चालु खर्च	चालु खर्च	-	११५७४	-	५९.९	६८९७	५९.९
२	समानिकरण	सिंचाइ	६०	१०९,१४०	३०	३०		२१.२
		नदि नियन्त्रण	२८	४०,५००	१२	३०		२१
		उर्जा	१७	४२,०००	८	५०		२१
		खानेपानी	५१	९७,६६२	१५	२१		२१
		अन्य सार्वजनिक सुधार	२	९७,६६२	२	६०		२१
३	सशर्त (संघ)	सिंचाइ	१२	६००००	०८	३०	९,९२८	१६.५%
		नदि नियन्त्रण	२	२००००	२	५०	२५८३	१२.९२
		खानेपानी	११	३०८००	५	४०	३२६९	१०.६१%
		अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल जम्मा			१८३	४३३४१४	७१	४०	८८८९२	२०.५

खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा बिकाश कार्यालय रुकुम (पश्चिम) को दोश्रो चौमासिकसम्माको प्रगति

(रु. हजारमा)

क्र. सं.	खर्च शिर्षक	कार्यक्रम क्रियाकलाप	विनियोजन र लक्ष्य		भौतिक प्रगति		वित्तिय प्रगति	
			भौतिक लक्ष्य (प्रतिशत, वटा)	विनियोजन रकम	परिमाण (प्रतिशत, वटा)	प्रगति प्रतिशत	बजेट (खर्च)	प्रगति प्रतिशत
१	चालु खर्च	चालु खर्च	१००%	११०७९।००	५०%	५०%	६३९८।१४२७	५७।७५
२	समानिकरण	सिंचाइ	५५ वटा	९९५००।००	२४ वटा	४४%	९३६३।६५४	०।०९४
		नदि नियन्त्रण	२९ वटा	४२०००।००	१९ वटा	६४%	३८७२।४३८	१०।८४
		उर्जा	२५ कि मी	२००००।००	६.२५ कि मी	२५%	१४०।०४०	०।००७
		खानेपानी	६९ वटा	१०४६००।००	२२ वटा	३१.२३%	१२१२.१६४	०।०११
		अन्य सार्वजनिक सुधार	७ वटा	१०७००।००	१ वटा	१२ %	९२३।०५४	०।०८६
३	सशर्त (संघ)	सिंचाइ	४ वटा	११९००।००	२ वटा	५०%	०।००	०।००
		नदि नियन्त्रण	० वटा	०।००	० वटा	०.००	०।००	०।००
		खानेपानी	१९ वटा	२४५००।००	६ वटा	२७.८९	१४२.४००	०।००६
		अन्य	० वटा	०।००	० वटा	०.००	०।००	०।००
कुल जम्मा				३२४७७९।००			२२०५२.२७	६.७९

खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा विकास कार्यालय जुम्लाको दोश्रो चौमासिकसम्मको प्रगति

क्र.सं.	खर्च शिर्षक	कार्यक्रम क्रियाकलाप	विनियोजन र लक्ष्य		भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	
			प्रतिशत	विनियोजन रकम		बजेट (खर्च)	प्रगति प्रतिशत
१.	चालु खर्च	चालु खर्च	२.३३	७,३२८,०००	०.९	२,८३१,५५७	०.९
२.	समानिकरण	सिंचाई	४१.२८	१३०,९५०,०००	८.५	१९,५५७,०००	६.१६
		नदी नियन्त्रण	१९.९	५६,१५०,०००	६.५	१४,४३८,०००	४.५५
		ऊर्जा	७.७८	२४,७००,०००	१	०	०
		खानेपानी	२९.०८	९२,२६५,०००	३.५	५,९६०,०००	१.८७
३.	सशर्त (संघ)	सिंचाई	१००	१३,०००,०००	४५	३,३९६,८६४	४०
		खानेपानी	१००	३१,४००,०००	१०	०	०

विनियोजित बजेट रु ३५५,७९३,०००.००

खर्च रु ५८,३४०,५१३.००

वित्तिय प्रगति १६.४० % र भौतिक प्रगति २५.००%

खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा विकास कार्यालय रुकुम दैलेखको दोश्रो चौमासिकसम्मको प्रगति

रकम रु
हजारमा_

सी.न.	खर्च सिर्शक	कार्यकर्म क्रियाकलाप	विनियोजित र लक्ष्य		भौतिक प्रगति		वित्तीय प्रगति		कैफियत
			भौतिक लक्ष्य (प्रतिशत, वटा)	विनियोजित रकम	परिमाण (प्रतिशत, वटा)	प्रगति प्रतिशत	बजेट खर्च	प्रतिशत प्रगति	
१	चालु खर्च	चालु खर्च		१२७७३			५८५५	४६.९४	
२	समानीकरण	सिंचाई	१०५ ओव्ता	१४३६००	५ वटा	४०	१२१३१	८.४४	
		नदि नियन्त्रण	३६ वटा	५५१००	४ वटा	६०	६५६७	११.९१	
		उर्जा	३ वटा	६०८००		१०	७०७४	११.६३	
		खानेपानी	१३२ वटा	१९९२६०			४९८९	२.५०	
		अन्य सार्वजनिक सुधार	१ वटा	७५००			५७४	७.६५	
३	ससर्त	सिंचाई	२२ वटा	३८७००			०		
		नदि नियन्त्रण							
		खानेपानी	२२ वटा	५३५००			३२६	०.०६	
		अन्य							
	कुल जम्मा			५७०३३			३७५१६	६.५७	

खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा विकाश कार्यालय जाजरकोटको दोश्रो चौमासिकसम्मको प्रगति

क्र. सं.	खर्च शिर्षक	कार्यक्रम क्रियाकलाप	विनियोजन र लक्ष्य		भौतिक प्रगति		वित्तीय प्रगति	
			भौतिक लक्ष्य (प्रतिशत, वटा)	विनियोजन रकम	परिमाण (प्रतिशत, वटा)	प्रगति प्रतिशत	बजेट (खर्च)	प्रगति प्रतिशत
१	चालु खर्च	चालु खर्च		९२०८			४१११	४४.६५
२	समानिकरण	सिंचाइ	३२.९०	१०७४००	९.००	२७.३६	४७५८	४.४३
		नदि नियन्त्रण	८.४२	२७५००	२.९४	२५.४२	३९७९	९९.५३
		उर्जा	८.९७	२६६८४	२.००	२४.४८	३९४३	९९.७८
		खानेपानी	२७.२६	८९०००	८.००	२९.३४	९२९६	९.४६
		अन्य सार्वजनिक सुधार	३.५२	९९५००	.५०	९४.२०	९२८६	९९.९८
३	सशर्त (संघ)	सिंचाइ	९.९६	३२५००	.५	५.०२	४९८	९.२८
		नदि नियन्त्रण						
		खानेपानी	९७७	३९९००	३.००	३०.७९	४०३४	९२.६४
		अन्य						
कुल जम्मा				३३५६९२			२२६११	वित्तीय ५.५५ % भौतिक २५.१४%

(रु. हजारमा)

खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा विकाश कार्यालय डोल्पाको दोश्रो चौमासिकसम्मको प्रगति

(रु. हजारमा)

क्र. सं.	खर्च शिर्षक	कार्यक्रम क्रियाकलाप	विनियोजन र लक्ष्य		भौतिक प्रगति		वित्तिय प्रगति	
			भौतिक लक्ष्य (प्रतिशत, वटा)	विनियोजन रकम	परिमाण (प्रतिशत, वटा)	प्रगति प्रतिशत	बजेट (खर्च)	प्रगति प्रतिशत
१	चालु खर्च	चालु खर्च	१००	८००९			१८३४	२२.८९
२	समानिकरण	सिंचाइ	१००	९१७००	४५.५	४५.५	८५७०	९.३४
		नदि नियन्त्रण	१००	३५१००	५४.५	५४.५	६८६६	१९.५६
		उर्जा	१००	२०००	३५.५	३५.५	०	०
		खानेपानी	१००	७८५००	४३.५	४३.५	९७१०	१२.३७
		अन्य सार्वजनिक सुधार	१००	६९००	५५.४	५५.४	२६५०	३८.४०
३	सशर्त (संघ)	सिंचाइ	१००	५७०००	४५.५	४५.५	९२३५	१६.२
		नदि नियन्त्रण	१००	३०००	३०.५	३०.५	०	०
		खानेपानी	१००	२५१००	३५.५	३५.५	१२५०	.५०
		अन्य						
कुल जम्मा			१००	३०७३०९	४३.३	४३.३	४०११५	१३.०५

खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा विकाश कार्यालय कालिकोटको दोश्रो चौमासिकसम्मको प्रगति

क्र.स.	खर्च शिर्षक	कार्यक्रम कृयाकलाप	बिनियोजन र लक्ष्य		भौतिक प्रगति		वितिय प्रगति
			भौतिक लक्ष्य (प्रतिशत,वटा)	विनियोजन रकम	परिमाण (प्रतिशत,वटा)	प्रगति प्रतिशत	
१	चालु खर्च	चालु खर्च	१	८,०८६,०००			१,२०८,७७२
२	समानिकरण	सिचाइ	८२	१२५,४००,०००	५	८.००	४,९६४,५६७
		नदि नियन्त्रण	३४	४०,५००,०००	३	१४.९४	३,१८८,४५३
		ऊर्जा	५	३४,३००,०००	०	४.००	०
		खानेपानी	९८	१०४,३०१,०००	१	२४.३४	१६,९६५,८४८
		अन्य सार्वजनिक सुधार	३	५,५०३,०००	०	२.२४	२,४९७,७२७
३	शर्शत संघ	सिचाइ	९	४७,०००,०००	०	१०.७५	१,१५४,६२१
		नदि नियन्त्रण	०	०	०	०	०
		खानेपानी	३३	२६,४००,०००	०	१०.१८%	०
		अन्य	०	०	०	०	०
कुल जम्मा			२६५	३९१,४९०,०००	९	६४	२९,९७९,९८७.८०

खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा विकाश कार्यालय हुम्लाको दोश्रो चौमासिकसम्मको प्रगति

(रु. हजारमा)

क्र. सं.	खर्च शिर्षक	कार्यक्रम क्रियाकलाप	विनियोजन र लक्ष्य		भौतिक प्रगति		वित्तीय प्रगति	
			भौतिक लक्ष्य (प्रतिशत, वटा)	विनियोजन रकम	परिमाण (प्रतिशत, वटा)	प्रगति प्रतिशत	बजेट (खर्च)	प्रगति प्रतिशत
१	चालु खर्च	चालु खर्च		११५९५०००			६८७५९६०।६०	५९।३०
२	समानिकरण	सिंचाइ	३७	६७००००	३० वटा संझौता भई कार्यान्वयनमा गएको ।			०
		नदि नियन्त्रण	१२	१४०००	२ वटा सम्पन्न १० वटा संझौता भई कार्यान्वयनमा गएको ।	४० प्रतिशत	२०००	१४।२८
		उर्जा	१	६३००	संझौता भई कार्यान्वयनमा गएको ।	३० प्रतिशत	१८००	२८।५७
		खानेपानी	२७	७२७००	२१ वटा संझौता भई कार्यान्वयनमा गएको	२० प्रतिशत	२८००	३।८५
		अन्य सार्वजनिक सुधार	०					
३	सशर्त (संघ)	सिंचाइ	२१	२२०००	१६ वटा संझौता भई कार्यान्वयनमा गएको	१० प्रतिशत	०	०
		नदि नियन्त्रण	०					
		खानेपानी	१३	२४२००	८ वटा संझौता भई कार्यान्वयनमा गएको	१० प्रतिशत	०	०
		अन्य	०					
कुल जम्मा			१११	२०६२००।००		२० प्रतिशत	६६००	३।२

खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा विकाश कार्यालय मुगुको दोश्रो चौमासिकसम्मको प्रगति

(रु. हजारमा)

क्र. सं.	खर्च शिर्षक	कार्यक्रम क्रियाकलाप	विनियोजन र लक्ष्य		भौतिक प्रगति		वित्तिय प्रगति	
			भौतिक लक्ष्य (प्रतिशत, वटा)	विनियोजन रकम	परिमाण (प्रतिशत, वटा)	प्रगति प्रतिशत	बजेट (खर्च)	प्रगति प्रतिशत
१	चालु खर्च	चालु खर्च		6836	30.02	26.01	1852	26.01
२	समानिकरण	सिंचाइ	56	96500	25.04	9.01	8321	8.69
		नदि नियन्त्रण	38	33200	25.03	5.03	1666	5.01
		उर्जा	1	200			0	0
		खानेपानी	56	68953	38.09	33.02	22085	32.02
		अन्य सार्वजनिक सुधार		1568	30.04	10.07	157	10.07
३	सशर्त (संघ)	सिंचाइ	15	47500	28.03	3.60	1697	3.57
		नदि नियन्त्रण						
		खानेपानी	6	19000	30.05	3.70	689	3.62
		अन्य						
कुल जम्मा				242309		20.05	36467	15.04

जलश्रोत तथा ऊर्जा बिकास मन्त्रालय र यस अन्तर्गत कार्यालयको आ ब २०७८। २०७९ को समानिकरण तर्फको फागुन सम्मको खर्च (प्रदेश को.ले.नि.का बाट प्राप्त)

सि न	कार्यालयको नाम	ब.उ.शि.न	खर्च रु हजारमा			बजेट	खर्च प्रतिशत
			चालु	पूँजिगत	जम्मा		
१	जलश्रोत तथा ऊर्जा बिकास मन्त्रालय	३०८०००११	७२३८१००	११०६७००	१८३०५१००	३६४५४२	५१०२
२	जलश्रोत तथा ऊर्जा बिकास निर्देशनालय सुर्खेत	३०८०००११	४३७५१००	५०९१६१००	५५२९११००	५२२७१२	१०५८
३	जलश्रोत तथा ऊर्जा बिकास कार्यालय रुकुम	३०८०००११	६१६०१००	१५५१११००	२१६७११००	२९०८७९	७४५
४	जलश्रोत तथा ऊर्जा बिकास कार्यालय सल्यान	३०८०००११	२१२३१००	५२३७७००	५४५००१००	३०२९९४	१७९९
५	जलश्रोत तथा ऊर्जा बिकास कार्यालय डोल्पा	३०८०००११	१७४६१००	१७९०७००	१९६५३१००	२२२६०९	८८३
६	जलश्रोत तथा ऊर्जा बिकास कार्यालय जुम्ला	३०८०००११	२७९२१००	३५४३३१००	३८२२५१००	३१७३९३	१२०४
७	जलश्रोत तथा ऊर्जा बिकास कार्यालय मुगु	३०८०००११	१६९११००	५८४२१००	७५३३१००	२१२६९०	३१४
८	जलश्रोत तथा ऊर्जा बिकास कार्यालय कालिकोट	३०८०००११	१९७०१००	१७०५९१००	१९०२९१००	३३७३०३	५६४
९	जलश्रोत तथा ऊर्जा बिकास कार्यालय जाजरकोट	३०८०००११	४५०६१००	२१३२७००	२५८३३१००	२७३२९२	९१४५
१०	जलश्रोत तथा ऊर्जा बिकास कार्यालय दैलेख	३०८०००११	१५७११००	३०९१७००	३२४८८१००	४६८७८१	६१३
११	जलश्रोत तथा ऊर्जा बिकास कार्यालय हुम्ला	३०८०००११	१९१८१००	२९८११००	४८९९१००	२५०४४०	११६
	जम्मा		३६०९०१००	२६१३३७	२९७४२७००	३५६३६३५	घघघ
		जम्मा खर्च प्रतिशत					८१३

फागुन २० सम्माको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय वाट भए गरेका मुख्य मुख्य कार्यको विवरण

- ▶ फागुन २० सम्माको भौतिक प्रगति: ३० %
- ▶ फागुन २० सम्माको वित्तिय प्रगति: ११.२ %
- ▶ भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका खानेपानी तथा सरसफाई अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरुको कार्य जिम्मेवारी यस मन्त्रालयमा थप भइ उक्त कार्यक्रमहरु PLMBIS मा प्रविस्ट गरि प्रमानिकरण भएको ।
- ▶ O & M तथा कार्यालयको नाम संग सम्बन्धित समस्याहरु समाधान भई मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका सम्पूर्ण निकाय/ कार्यालयहरुले आ- आफ्ना कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेका छन ।
- ▶ सरुवा व्यवस्थापन भएको ।
- ▶ कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धि काम ।
- ▶ सवारी साधन खरिद सम्बन्धि काम ।

• बजेट कार्यान्वयनबाट हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू (समग्र एकीकृत उपलब्धीहरू)

- ▶ सिंचाइ तर्फ: कुल जम्मा ३२० हे. जमिनमा थप सिंचाइ सुविधा उपलब्द गराउन सफल
- ▶ खानेपानी तर्फ: कुल जम्मा ५१० थप घरधुरीमा स्वस्छ खानेपानी सुविधा उपलब्द गराउन सफल
- ▶ नदि नियन्त्रण तर्फ: ३.९० कि.मि तटबन्धन निर्माण भई २९ हे. थप जमिन उकास भएको
- ▶ उर्जा तथा बिधुतिकरण तर्फ: बिधुतिकरण विस्तार तथा सौर्य उर्जा जडान गरि कुल जम्मा ३७० घरधुरी लाभांवित
- ▶ अन्य:

समस्याहरू

- ▶ O&M को सम्बन्धमा कर्मचारी असन्तुष्ट भइ मुद्दा परेको हुदा कर्मचारीमा वितृष्णा पैदा भइ कार्यालयको काममा ढिलासुस्ती भयको ।
- ▶ प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार पदपुर्ति नहुनु ।
- ▶ स्पष्ट कार्यविधिको अभाव (बिधुत बिकाश,टार सिंचाई,योजना तर्जुमा आदि)
- ▶ १५ लाख मुनिका योजना व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको ।
- ▶ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य संचालनमा दोहोरोपना सिर्जना भएको ।
- ▶ कर्मचारीको अभावको कारण अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी हुन नसकेको ।
- ▶ प्रदेशबाट विभिन्न नीति नियम तथा निर्माण कार्यको नर्म्स स्वीकृति नभएको हुँदा विविधतापूर्ण केन्द्रको नर्म्स प्रयोगमा समस्या ।
- ▶ कोभिड-१९, लकडाउनका र कच्चा तेल लगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिका कारण कार्यसंचालनमा कठिनाई, महंगी र सामग्री अभावको कारण निर्माण कार्यमा ढिला सुस्ती
- ▶ ठेकेदारहरू बोलपत्रमा अत्यन्त न्यून कबोल गर्ने र विभिन्न बाहानामा कार्य सुचारु नगर्ने समस्या

Bagchaur WSP, Bagchaur Municipality, Salyan





मैनतडा के-वर्ड सि.यो. भे.न.पा.-०८, सुर्खेत



गदले सि.यो.पञ्चपुरी, सुर्खेत
