



## बार्षिक प्रगति समीक्षा

आ.व. २०७८/०७९

### जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय

कर्णाली प्रदेश  
विरेन्द्रनगर सुर्खेत

सि डि इ गोपाल शर्मा

#### प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ (संशोधन सहित) मन्त्रालयका कार्य जिम्मेवारीहरु

- प्रदेशस्तरको ऊर्जा, विद्युत, सिंचाइ, खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धि अध्ययन अनुसन्धान, नीति, कानून, मापदण्ड, गुरुयोजना निर्माण, आयोजना निर्माण, मर्मत संभार, कार्यान्वयन नियमन र समन्वय
- उल्लेखित सेवाको गुणस्तर र सेवाको शुल्कको आधार निर्धारण र नियमन
- निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानी प्रवर्धन सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण र नियमन
- प्रदेश सिमा नदीका जलउपयोग सम्बन्धी आयोजनाको पहिचान, निर्माण, संचालन, सम्भार र व्यवस्थापन
- नदी संरक्षण सम्बन्धी योजना तथा गुरु योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मुल्याङ्कन
- मौसम र जलमापन संचार संजाल व्यवस्थापन
- जलगुण तथा वायुगुण सम्बन्धी प्रयोगशाला व्यवस्थापन
- जलाधार संरक्षण तथा जलउपयोग नीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन
- प्रविधि विकास र व्यवस्थापन

### मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको कुल स्वीकृत दरबन्दी तथा पदपुर्तिको अवस्था

क्र.सं.	वैपी/तह	पद	समुह /उपसमुह	स्वीकृत दरबन्दी	पदपुर्ती	रिक्त	कैफियत
१	रा.प्र. प्रथम	सचिव	ने.इ./सिभिल/इरि/स्या/हा.पा.	१	१	०	
२	एघारौं	निर्देशक	ने.इ./सिभिल/इरि/स्या/हा.पा.	१	०	१	
३	नवौं/दशौं	उप-सचिव	प्रशासन/सा.प्रशासन	१	०	१	
४	नवौं/दशौं	सि.डि.इ.	इन्जिनियरीङ/सिभिल/इरिगेसन	४	२	२	
५	नवौं/दशौं	सि.डि.इ.	इन्जिनियरीङ/सिभिल/स्यानिटरी	१	०	१	
६	नवौं/दशौं	सि.डि.इ.	ने.इ./सिभिल/हा.पा.	२	०	२	
७	नवौं/दशौं	कार्यालय प्रमुख	ने.इ./सिभिल/इरी/स्यानिटरी/हा.पा.	४	२	२	
८	सातौं/आठौं	अधिकृत	प्रशासन/सा.प्रशासन	३	१	२	
९	रा.प. तृतीय	कानून अधिकृत	न्याय/कानून	१	०	१	
१०	सातौं/आठौं	लेखा अधिकृत	प्रशासन/लेखा	२	२	०	
११	सातौं/आठौं	इन्जिनियर	इन्जिनियरीङ/सिभिल/इरिगेसन	८	५	३	
१२	सातौं/आठौं	इन्जिनियर	इन्जिनियरीङ/सिभिल/स्यानिटरी	६	२	४	
१३	सातौं/आठौं	इन्जिनियर	ने.इ./सिभिल/हा.पा.	२	०	२	
१४	सातौं/आठौं	इन्जिनियर	ने.इ./इले.इलेक्ट्रिकल जनरल	२	०	२	
१५	सातौं/आठौं	कार्यालय प्रमुख	ने.इ./सिभिल/उपसमुहकुल नहुने	५	५	०	
१६	पाचौं/छैटौं	सहायक/अधिकृत	प्रशासन/सा.प्रशासन	१४	१४	०	
१७	पाचौं/छैटौं	कम्प्युटर सहायक	बिबिध/प्राबिधिक	२	०	२	
१८	पाचौं/छैटौं	सहायक/अधिकृत	प्रशासन/लेखा	१०	१०	०	
१९	पाचौं/छैटौं	सब-इन्जिनियर	इन्जिनियरीङ/सिभिल/इरिगेसन	२३	२१	२	
२०	पाचौं/छैटौं	सब-इन्जिनियर	इन्जिनियरीङ/सिभिल/स्यानिटरी	२१	४	१७	
२१	पाचौं/छैटौं	सब-इन्जिनियर	ने.इ./सिभिल/हा.पा.	१०	०	१०	
२२	पाचौं/छैटौं	सब-इन्जिनियर	ने.इ./इले.इलेक्ट्रिकल जनरल	५	०	५	
२३	पाचौं/छैटौं	सब-इन्जिनियर	ने.इ./मेका./मेकानिकल जनरल	१	०	१	
२४	पाचौं/छैटौं	खा.पा.स.टे.	इन्जिनियरीङ/सिभिल/स्यानिटरी	१४	७	७	
२५	पाचौं/छैटौं	सि.पु. अर्नाइजर	इन्जिनियरीङ/एरी इरिगेसन	५	४	१	
२६	पाचौं/छैटौं	महिला कार्यकर्ता	बिबिध	६	३	३	
२७	चौथो/पाचौं	खा.पा.स.टे.	इन्जिनियरीङ/सिभिल/स्यानिटरी	१०	०	१०	
२८	चौथो/पाचौं	एशोसियेशन	इन्जिनियरीङ/एरी इरिगेसन	५	२	३	
२९	चौथो/पाचौं	लेखा सहायक	प्रशासन/लेखा	१	१	०	
३०	चौथो/पाचौं	सहायक	प्रशासन/सा.प्रशासन	१	१	०	
३१	श्रेणी विहिन	ह.स.चा.	प्रशासन/सा.प्रशासन	२१	१७	४	
३२	श्रेणी विहिन	कार्यालय सहयोगी	प्रशासन/सा.प्रशासन	३०	३०	०	
		<b>जम्मा</b>		<b>२२२</b>	<b>१३४</b>	<b>८८</b>	


### वार्षिक बजेट तथा खर्च


क्र.सं.	बजेट	विनियोजित रकम (रु हजारमा)	खर्च रकम (रु हजारमा)	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१.	चालु	१६०८६८	८६५४७	५३.८	
२.	पूँजीगत	५३६२१०४	३८३०१३४	७१.४३	
	<b>कुल जम्मा</b>	<b>५५२२९७२</b>	<b>३९१६६८१</b>	<b>७०.९१</b>	

## आयोजना/कार्यक्रमगत प्रगति

क्र.सं.	आयोजना/ कार्यक्रम	इकाइ	विनियोजन र लक्ष्य		भौतिक प्रगति		वित्तीय प्रगति		देखिने परिवर्तन १/१ बटा
			भौतिक लक्ष्य	विनियोजन रकम	परिमा ण	प्रगति प्रतिशत	बजेट (खर्च)	प्रगति प्रतिशत	
१.	प्रशासनिक	प्रतिशत	१००	१६०८६८		५५	८६५४७	५३.८	
२.	समानीकरण	प्रतिशत	१००	३५९२७८ ५		८०	२६८८६४८	७४.८३	
३.	सशर्त (संघ)	प्रतिशत	१००	१७५९८४ ५		७२	११४१४८५	६४.८६	
<b>कुल जम्मा</b>				<b>५५२२९७२</b>			<b>३९१६६८१</b>	<b>७०.९१</b>	

## क्षेत्रगत बजेट बाँडफाँडको अवस्था

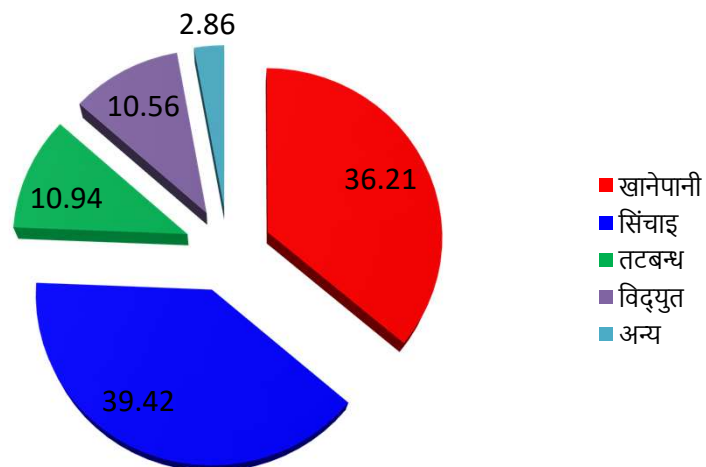

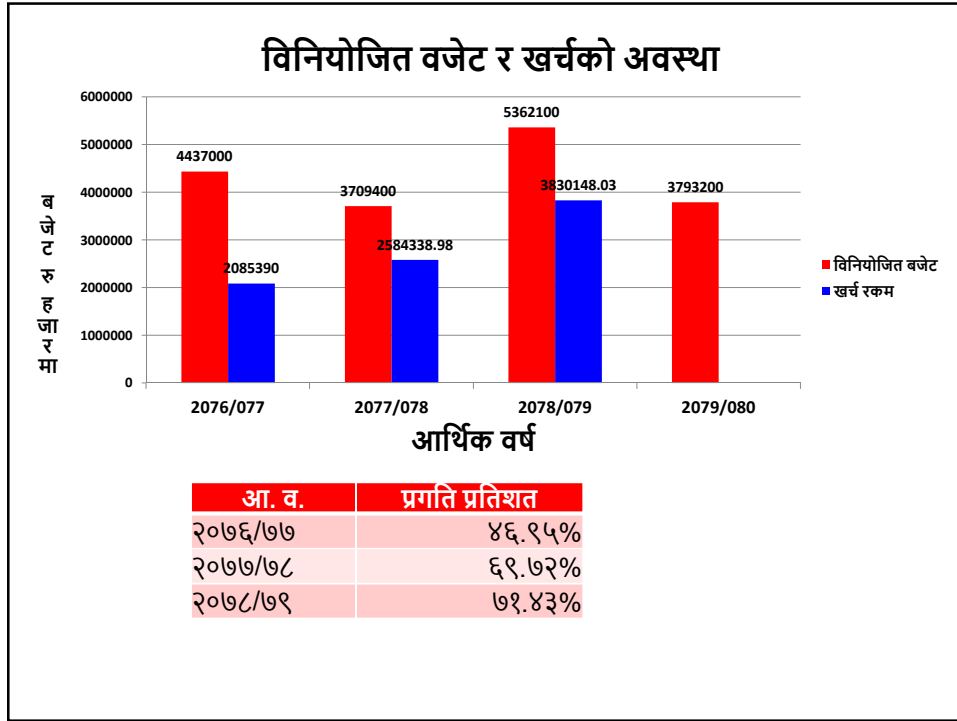

### मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको बार्षिक प्रगति विवरण

मन्त्रालय/ कार्यालय	समानिकरण अनुदान तर्फ ( प्रदेश )				
	कुल योजना संख्या	कार्यान्वयन नभएको योजना संख्या	कूल विनियोजित बजेट रु हजारमा	खर्च रु हजारमा	खर्च %
मन्त्रालय	५०	२०	१२०६०६	२५८३२	२१.४२
सुर्खेत	३७२	१०४.	५९३६६०	४२८१२१.४५	७२.१२
दैलेख	३०५	५४.	६१६९००	४७८६१९.०४	७७.५८
जुम्ला	१९४	३३.	३१९९६५	२६७३३२.७५	८३.५५
कालिकोट	२३२	४५.	३५१३७०	२४९२००.	७०.९२
सल्यान	१५५	२३.	३२३०४०	२९०५७०.	८९.९५
रुकुम	१५८	२१.	२५२६००	१६३५९१.	६४.७६
जाजरकोट	२५२	२३.	३१६५८४	२१९४०८.	६९.३
हुम्ला	२३४	१०.	२६७१०६	२३६९९०.५	८८.७३
डोल्पा	२४१		२२५१००	१८४३०६.	८१.८८
मुगु	१७५	५.	२०५८५४.	१४४६७८.	७०.२८
जम्मा	२३६८	३३८.	३५९२७८५	२६८८६४८.७४	७४.८३

### मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको बार्षिक प्रगति विवरण


मन्त्रालय/ कार्यालय	सशर्त अनुदान तर्फ(संघ)				
	कुल योजना संख्या	कार्यान्वयन नभएको योजना संख्या	कुल विनियोजित बजेट रु हजारमा	खर्च रु हजारमा	खर्च %
मन्त्रालय	१		१२०००	०.	०.
सुर्खेत	७६	२८	१९८७५३	९२०५८.१४	४६.३२
दैलेख	५०	०	१२९२००	९०४७४.६२	७०.०३
जुम्ला	२९		४६४००	३१७८५.६	६८.५
कालिकोट	४९		१०६२००	५७५११.	५४.१५
सल्यान	२६	२	२००८००	१६६३६१.	८२.८५
रुकुम	३९	१	६२७०३५	४०५१४३	६४.६१
जाजरकोट	३७	९	१५१९००	६६२७०	४३.६३
हुम्ला	२८	०	४५२००	३६५३२.३८	८०.८२
डोल्पा	२४		१२७८५७	१०८६००	८४.९४
मुगु	२२	०	११४५००	८६७५०	७५.७६
जम्मा	३५७	४०	१७५९८४५	११४१४८५.७४	६४.८६

### मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको बार्षिक प्रगति विवरण

मन्त्रालय/ कार्यालय	कुल योजना संख्या	कुल बजेट रु हजारमा	कुल खर्च रु हजारमा	कुल प्रगति
मन्त्रालय	५१.	१३२६०६	२५८३२	१९.४८
सुर्खेत	४४८.	७९२४१३	५२०१७९.५९	६५.६५
दैलेख	३५५.	७४६१००	५६९०९३.६६	७६.२८
जुम्ला	२२३.	३६६३६५	२९९११८.३५	८१.६४
कालिकोट	२८१.	४५७५७०	३०६७११	६७.०३
सल्यान	१८१.	५२३८४०	४५६९३१	८७.२३
रुकुम	१९७.	८७९६३५	५६८७३४	६४.६६
जाजरकोट	२८९.	४६८४८४	२८५६७८	६०.९८
हुम्ला	२६२.	३१२३०६	२७३५२२.८८	८७.५८
डोल्पा	२४१.	३५२९५७	२९२९०६	८२.९९
मुगु	१९७.	३२०३५४	२३१४२८	७२.२४
जम्मा	२७२५.	५३६२१०४	३८३०१३४.४८	७१.४३

समानिकरण तर्फको कुल प्रगति	७४.८३%	मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको कुल प्रगति	७१.४३%
सशर्त अनुदान तर्फको कुल प्रगति	६४.८६%	सशर्त अनुदान तर्फको कुल बचत	६१८३५९.२६

## जिल्लागत वित्तीय प्रगतिको सारांश

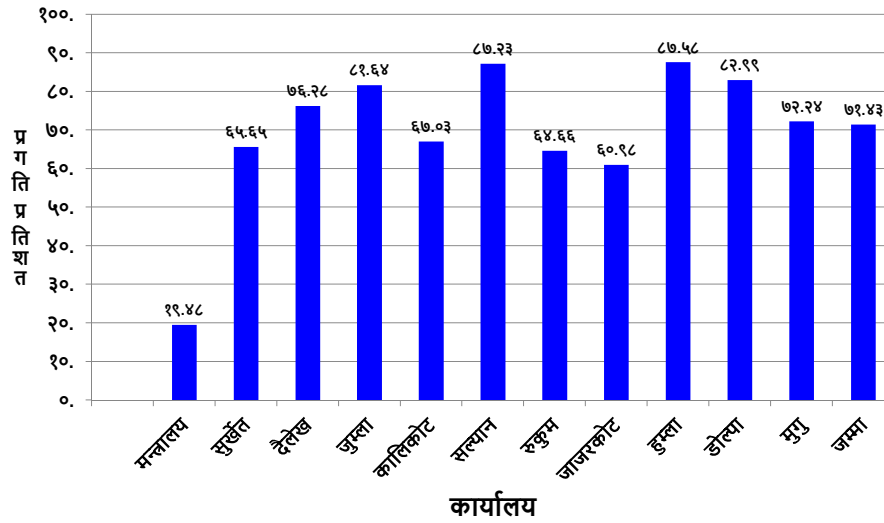

## आ.व २०७८/०७९ को बजेट कार्यान्वयनबाट प्राप्त उपलब्धि

मन्त्रालय/कार्यालय	कुल योजना संख्या	प्राप्त उपलब्धि				
		कुल सम्पन्न योजना संख्या	थप सिंचाई सुविधा पुगेको क्षेत्रफल (Ha)	नदि नियन्त्रण कार्यबाट विकास भएको जग्गाको क्षेत्रफल (Ha)	थप खानेपानी सुविधा पुगेको जनसंख्या	थप बिधुत सुविधा पुगेको जनसंख्या
मन्त्रालय	५१					
सुर्खेत	४४८	१०३	४००	२२	१२९४३	८३७
दैलेख	३५५	१४६	३००	५	४७००	
जुम्ला	२२३	१३५	२१७	७	५१००	५००
कालिकोट	२८१	८०	१६५	४	२७००	३५०
सल्यान	१८१	४१	३७०	४०	४५००	८००
रुकुम	१९७	१०२	२३०	१७	९७००	४३२
जाजरकोट	२८९	४५	११३	१९	५०७४	१८००
हुम्ला	२६२	२८	१४०	६	३२००	२१३
डोल्पा	२४१	१०५	१४५	७	४२००	६५०
मुगु	१९७	३६	१२०	९	२८००	३४१
जम्मा	२७२५	८२१	२२००	१३६	५४९१७	५९२३

## जलश्रोत तथा ऊर्जा बिकास मन्त्रालयको हालसम्मको प्राप्त उपलब्धि

क्षेत्र	आ. व. २०७६/७७	आ. व. २०७७/७८	आ. व. २०७८/७९	कूल जम्मा
खानेपानी (लाभान्वित संख्या)	२१४६७	३०८३४	५४९१७	१०७२१८
सिंचाई (हे.)	२९५५	२१२५	२२१०	७२९०
नदी नियन्त्रण (कि.मि.)	७.६५	१८.७७	१७.५५	४३।९७
जग्गा उकास (हे.)	८५	१८०	१७६	४४१
विधुत (लाभान्वित संख्या)		३५४०	५९२३	९४६३

## भुक्तानी छुट हुन गएका योजनाहरु र रकमको बिस्तृत विवरण

सि. नं	कार्यालय को नाम	समानिकरण अनुदान तर्फ भुक्तानी छुट भएका योजनाको संख्या	समानिकरण अनुदान तर्फ छुट भुक्तानी रु हजारमा	सशर्त अनुदान तर्फ भुक्तानी छुट भएका योजनाको संख्या	सशर्त अनुदान तर्फ छुट भुक्तानी रु हजारमा	भुक्तानी छुट भएका कुल योजनाको संख्या	कुल भुक्तानी छुट भएको रकम जम्मा रु हजारमा	कैफियत
१	सुर्खेत	२५	२७२६६	९	१५१३६	३४	४२४०२	
२	दैलेख	४५	४४५३४	१६	२५३००	६१	६९८३४	
३	सल्यान	०	०	०	०.०	०	०.०	
४	रुकुम	३३	५५०२०	५८	६४६७०	९१	११९६९०	
५	जुम्ला	०	०	०	०.०	०	०.०	
६	जाजरकोट	७३	४९०५५	२०	४७४६८	९३	९६५२४	
७	डोल्पा	०	०	२	३८०३	२	३८०३	
८	मुगु	६६	३९३६०	१६	१०८४५	८२	५०२०५	
९	हुम्ला	१३	१५७५०	२	५५००	१५	२१२५०	
१०	कालिकोट	१२	८०४६	२	२४००	१४	१०४४६	
	कूल जम्मा	२६७	२३९०३२	१२५	१७५१२६	३९२	४१४१५८	

**आ व २०७७/०७८ सम्मको मन्त्रालय र मातहत कार्यालयहरुको बेरुजुको बिस्तृत विवरण**

मन्त्रालय/ कार्यालय	असुल	नियमित	पेशकी	जम्मा
सुर्खेत	2383	23220	0	<b>25603</b>
रुकुम	80	18933	0	<b>19013</b>
सल्यान	0	0	0	<b>0</b>
डोल्पा	123	12165	0	<b>12288</b>
जुम्ला	342	1210	0	<b>1552</b>
मुगु	9380	11882	0	<b>21262</b>
हुम्ला	4110	2143	0	<b>6253</b>
कालिकोट	273	29042	13155	<b>42470</b>
जाजरकोट	187	0	100	<b>287</b>
दैलेख	0	331	0	<b>331</b>
<b>जम्मा</b>	<b>16878</b>	<b>98926</b>	<b>13255</b>	<b>129059</b>

### बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या

- हालसम्म पनि ४० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्तिको पद रिक्त अवस्थामा हुनु र कार्यालयको विद्यमान जनशक्ति एवं उपलब्ध साधनहरुको तुलनामा अत्यधिक धेरै मात्रामा योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्दा योजनाको गुणस्तर कायम गर्नका साथै अनुगमन र मुल्याङ्कनमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न चुनौती भएको ।
- भुगोल सुहाउदो तथा कार्यक्रम र कार्यबोझको आधारमा कार्यालयको सांगठनिक संरचना बन्न नसक्नु ।
- ऊर्जा क्षेत्रको बिकासको लागि आवश्यक कार्यालयको स्थापना र बिषय विज्ञ जनशक्ति नहुदा ऊर्जा क्षेत्रको बिकास प्रभावित भएको ।
- बजेट तर्जुमाको स्पष्ट मापदण्ड नबन्दा र तिनै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र निश्चित नहुदा ,योजना तर्जुमामा दुविधा उत्पन्न भएको र प्रदेश सरकारको आवधिक योजना अनुसार बजेट कार्यक्रम नआउने विद्यमान अवस्था रहेको ।
- सडक निर्माण गर्दा अधिकांश खानेपानी एवं सिंचाई संरचनाहरुमा क्षति पुगेको ।



## बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या

- Construction Material Testing Lab को स्थापना र प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा निर्माण कार्यको गुणस्तर जाँच गर्न नसकिएको ।
- मन्त्रालयमा जनशक्ति अभाव हुदा जिल्ला कार्यालयबाट कार्यान्वयन भएका योजनाहरूको अनुगमन मुल्यांकन प्रभावकारी हुन नसकेको ।
- जिल्लामा जनशक्ति अभावकै कारण विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकि योजना प्रभावित हुनुका साथै संघीय सरकारबाट प्राप्त संघीय सशर्त अनुदान तर्फको ठूलो रकम फिर्ता हुन गई मन्त्रालयले ठूलो वित्तीय नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको ।
- करिब ४१ करोड भुक्तानी छुट भई मन्त्रालयमा दायित्व सिर्जना भयोको ।

## बजेट कार्यान्वयनबाट भएको सिकाई

- योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन योजना छनौट प्रकृत्यामा सुधार ल्याइ, योजनाको लाभ लागत अनुपात विश्लेषण गरी योजना तर्जुमा गर्न तथा योजना तर्जुमामा स्वयम कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन आयोजना पहिचान सम्बन्धी जिल्लास्तरीय अभिमुखिकरण गोष्ठी संचालन गर्नु पर्ने ।
- आयोजनालाई दिगो रूपमा संचालन गर्न तथा उपभोक्ताहरूको योजना प्रति अपनत्व भाव वृद्धि गर्न उपभोक्ता समितिलाई मर्मत संभार कार्यकर्ता तालिम तथा सिंचाइ संस्थागत विकास कार्यक्रमको संचालन गर्न आवश्यक देखिएको ।
- ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि आवश्यक कार्यालयको स्थापना र विषय विज्ञ जनशक्ति नहुदा ऊर्जा क्षेत्रको विकास प्रभावित भएकोले तत्काल समस्या समाधान हुन आवश्यक देखिएको ।
- प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूका वृति विकासका अवसर रोकिएकोले कर्मचारीमा नैराश्यता उत्पन्न भइ कामकाज प्रभावित हुने हुदा कानुन बनाइ वृति विकासका अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक देखिएको ।

## बजेट कार्यान्वयनबाट हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु (समग्र एकीकृत उपलब्धीहरु)

- सिंचाइ तर्फ: कुल जम्मा २२०० हे. जमिनमा थप सिंचाइ सुविधा उपलब्ध भएको।
- खानेपानी तर्फ: कुल जम्मा ५४९१७ थप जनसंख्यामा स्वच्छ खानेपानी सुविधा उपलब्ध भएको।
- नदि नियन्त्रण तर्फ: १७.५५ कि.मि तटबन्धन निर्माण भई १७६ हे. थप जमिन उकास भएको।
- उर्जा तथा बिधुतिकरण तर्फ: बिधुतिकरण विस्तार तथा सौर्य उर्जा जडान गरि कुल जम्मा ५९२३ जनसंख्या लाभान्वित भएको।
- कुल ८२१ योजना सम्पन्न भएका।
- कर्णाली प्रदेश बिधुत ऐन तर्जुमा सम्बन्धी काम प्रक्रियामा रहेको।

## मन्त्रालयको आगामी आ.व को बजेटमा समाबेस भएका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु

- योजना छनौट प्रकृत्यामा सुधार ल्याइ जनताको प्रत्यक्ष जीवनस्तर सुधार गर्ने, योजनाको लाभ लागत अनुपात विश्लेषण गरी योजना तर्जुमा गर्न तथा योजना तर्जुमामा स्वयम कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन आयोजना पहिचान सम्बन्धी जिल्लास्तरीय अभिमुखिकरण गोष्ठी संचालन बजेट छुट्याएको।
- आयोजनालाई दिगो रूपमा संचालन गर्न तथा उपभोक्ताहरुको योजना प्रति अपनत्व भाव वृद्धि गर्न उपभोक्ता समितिलाई मर्मत संभार कार्यकर्ता तालिम तथा सिंचाइ संस्थागत विकास कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको।
- विगत आर्थिक वर्ष देखिनै क्रमागत योजनाको रूपमा रहेका तर धेरै वर्ष देखि सम्पन्न हुन नसकेका क्रमागत योजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने नीति अनुरूप योजनाको प्रतिफल हासिल गर्न क्रमागत योजना यस आर्थिक वर्षमा ४० प्रतिशत योजना सम्पन्न हुने गरी प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको।

### मन्त्रालयको आगामी आ.व. को बजेटमा समावेश भएका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू

- कर्णाली प्रदेशमा रहेका सिंचाइयोग्य जमिनको संरक्षण गर्न तथा संरक्षित सम्पूर्ण कृषियोग्य भूमिमा बाहेमास सिंचाइ सुविधा पुऱ्याउन सिंचाइ तथा नदि नियन्त्रण सम्बन्धी संरचना निर्माण तथा टार सिंचाइ कार्यक्रमको लागि प्रतिफल देखिने गरी प्राथमिकीकरण गरी बजेट तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको।
- कर्णाली प्रदेशमा विद्युत पहुँचबाट टाढा रहेका जनतालाई विद्युतको सहज पहुँच स्थापित गर्न कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, विद्युत प्रसारण लाईन पुगेका जिल्लामा ग्रामिण विद्युतीकरण कार्यक्रम तथा विद्युत प्रसारण लाईन नपुगेका स्थानहरूमा नविकरणीय ऊर्जा विकास तथा सौर्य मिनिग्रिड सम्बन्धी कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था भएको।
- विकास निर्माणमा सरकारी क्षेत्रको साथसाथै निजी क्षेत्रको पनि अहम भूमिका हुने हुदा ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराउने उद्देश्यले सार्वजनिक, निजी साझेदारीको अवधारणालाई अगाडि बढाउने गरी PPP मोडलमा सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडानको कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको।

### मन्त्रालयको आगामी आ.व. को बजेटमा समावेश भएका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू

- विद्युतीकरण सम्बन्धी ठुला आयोजना संचालन गर्न आयोजना स्क्रिनिङ्ग न्याङ्किङ गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढाउने साथै विद्युत विकास स्थापना तथा लघु जलविद्युत नविकरणीय ऊर्जा लगायत नयाँ आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन तथा सर्वेक्षण गर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको।
- खानेपानी तथा सरसफाइ, सिंचाइ तथा ऊर्जा विकास सम्बन्धी जलस्रोतको समुचित व्यवस्थापन गर्न जलस्रोत क्षेत्रको नीति, नियम, ऐन, कानून निर्माणको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष पहल गरिने।
- पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित गर्न विद्युत खपत बढाउने उद्देश्यका साथ विद्युतीय चुलो तथा साधन प्रयोग प्रवर्द्धन कार्यक्रम, फोहोरलाई ऊर्जामा परिवर्तन गर्ने प्रविधि प्रवर्द्धन कार्यक्रम तथा विद्युतीय साधन चार्जिङ्ग स्टेशन सम्भाव्यता अध्ययन जस्ता कार्यक्रम संचालन हुने।



## Photographs.



मेनतडा के-वर्ड सि.यो. भे.न.पा.-०८, सुर्खेत  
8/4/2022



रिठाखेत सिंचाइ योजना सिम्ता गा.पा.-०१ र ०२  
क्रमशः<sup>23</sup>



8/4/2022

सोभानचौर लिफ्ट सिंचाइ योजना चौकुने गा.पा.- ०२

क्रमशः<sup>24</sup>



निकास खोला तटबन्ध कार्य, वि.न.पा.-२, ९ र १०

क्रमशः

8/4/2022

25



घुम्सा खानेपानी योजना वि.न.पा.

8/4/2022

26

**गुराँस लिफ्टिङ खानेपानी योजना, दैलेख**



**11 KV HT Line, Darma Rural Municipality, Salyan**



### **Spur at Babai Nadi Niyantran - Hattidamar**



### **SANGRAHI NADI NIYANTRAN**





सिम्लुतु बृहत तटबन्धन  
त्रिवेणी -२



100 cum RCC Tank  
Aathbikot-9





## Photographs.



विरौटा सिंचाइ योजना भेरी न पा १ जाजरकोट  
8/4/2022



सिकेज्युला सिंचाइ योजना  
क्रमशः<sub>33</sub>





कुदु लिपट सिंचाइ योजना भेरी न पा १३ जाजरकोट  
8/4/2022

34

## Koltara ISP, Salyan



## ओदा खानेपानी योजना महावै-१



8/4/2022

Water supply irrigation and Energy Development Office Kalikot

36

**खानेपानी सिचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय ,दुनै डोल्पाबाट आ.ब.  
२०७८.७९मा संचालन भएका विभिन्न योजनाका तस्वीरहरु**



रुप गाड सि.यो.



मेलसरा सि.यो.



डोटेनी सि.यो



सदरमकाम लक्ष्यालो



चौरीरमण जुफाल दलित बस्ति खा.पा.



मुकोट खा.पा.



गुगाउ खोला तटबन्ध



कागेनी तटबन्ध

37



**लेखधिङ्गा खानेपानी योजना नाम्खा गाउँपालिका १ हुम्ला**



**धन्यवाद**
